


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā¹. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais **statuss 2017. gada septembrī**.

2. Turpinās intensīvs projektu iesniegšanas, vērtēšanas un līgumu slēgšanas posms. Līdz 2017. gada 21. septembrim ir apstiprināti projekti par vairāk kā 2 mljrd. *euro*, kas ir gandrīz 49 % no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. *euro* (pieaugums 2017.gada augusta laikā – 3,4 % jeb 150 milj. *euro* un papildus 76 milj. *euro* nepilnu 3 nedēļu laikā 2017. gada septembrī). Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļu vietnēs².

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. septembrim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. augustam”

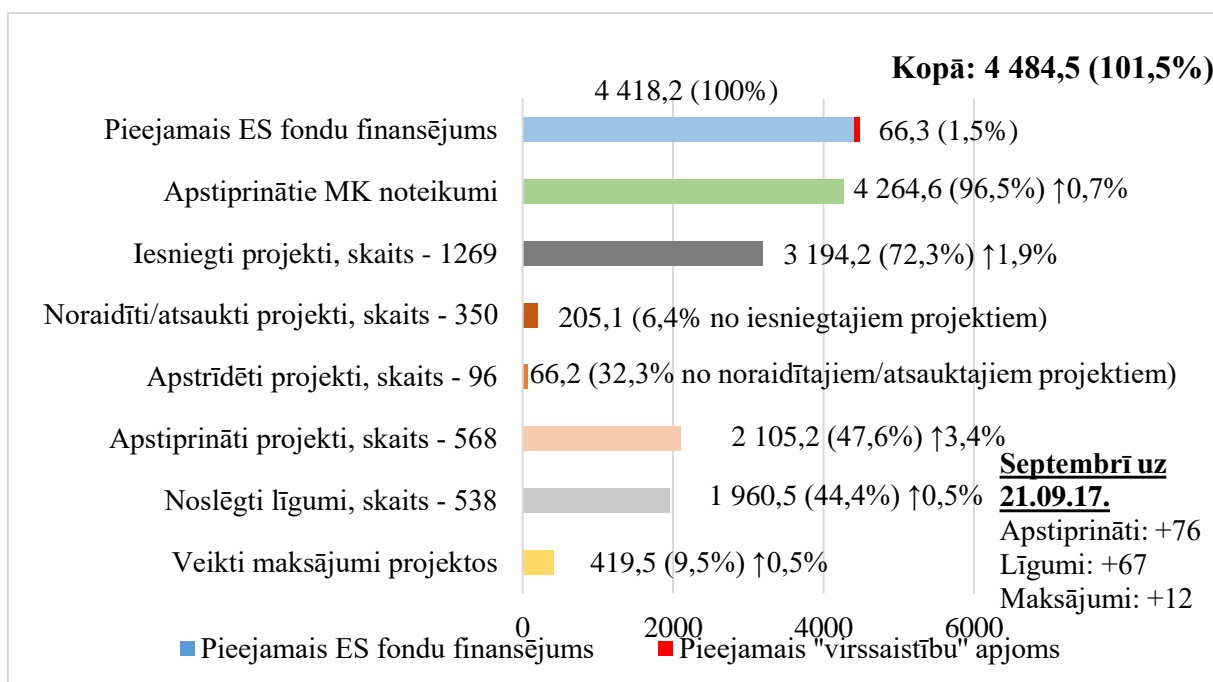


3. 2017. gada 4. ceturksnī ir atlicis apstiprināt par 148 milj. *euro* ES finansējuma investīciju nosacījumus (MK noteikumi), no kuriem kavēti par 87 milj. *euro*. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par atlikušo MK noteikumu virzības statusu.

¹ FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā tiek sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.

² Finanšu rādītāju plāni un to izpilde <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un aktuālā CFLA atlasu informācija pieejama: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>

Grafiks Nr.2 “2017. - 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 2017. gada 21. septembrim, milj. euro)”

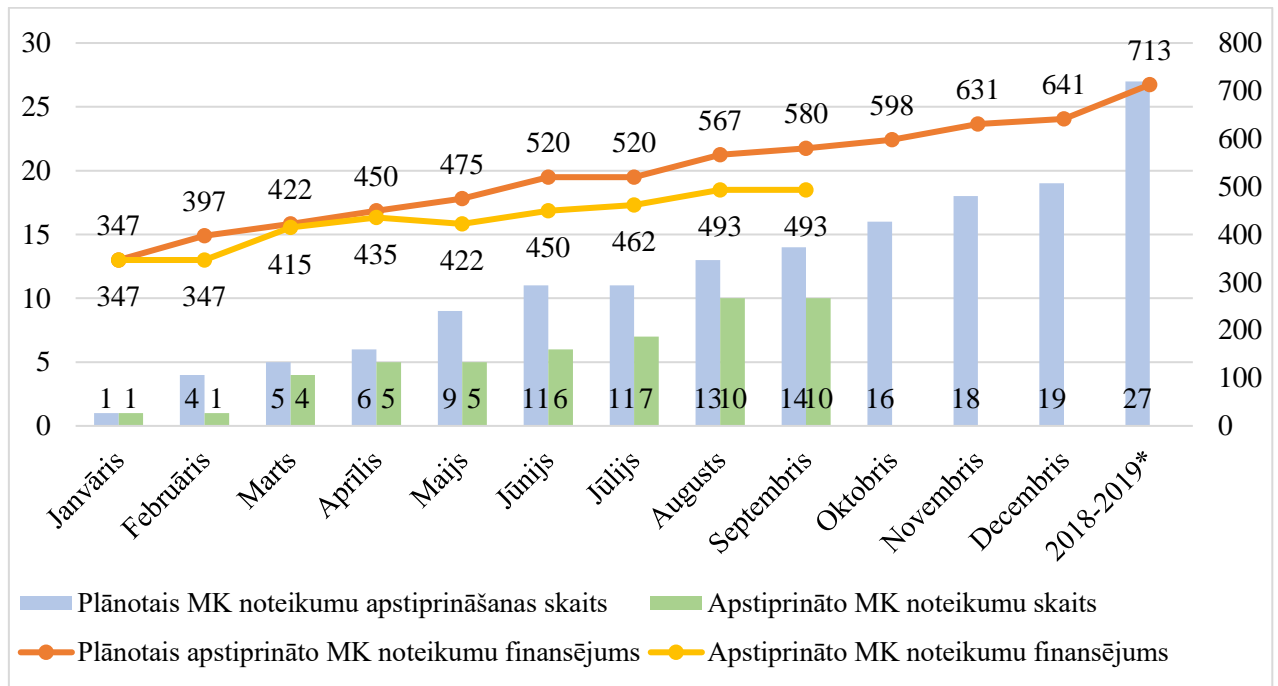

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus, kuru īstenošana paredzēta pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu.


4. Joprojām ievērojamākie kavējumi ES fondu atbalsta investīciju noteikumu izstrādē un apstiprināšanā ir Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - IZM), kur neizpilde ir 52 % no kopējā kavēto MK noteikumu investīciju apjoma (atbalsts inovāciju grantiem studentiem (28,9 milj. euro) un labākas pārvaldības augstākās izglītības institūcijās nodrošināšanai (17 milj. euro)). Finanšu ministre ir aicinājusi izglītības un zinātnes ministru veikt pasākumus līdzšinējo kavējumu maksimāli efektīvā novēršanā un investīciju progresa veicināšanā kopumā IZM kompetences jomās. Savukārt Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (27,6 milj. euro) un Veselības ministrijas (turpmāk - VM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi par veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārtai (13,4 milj. euro).

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums

5. Kopā maksājumu temps arvien vairāk atpaliek no plānotā – līdz 2017. gada 1. septembrim no kopējā plāna 207,8 milj. euro ir izpildīti 85,7 %, jeb 178,1 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama ziņojuma 2.pielikumā un tīmekļa vietnē³.

³ Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016.gada 2.pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>. Papildus skatīt skaidrojumu un rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam, 30. jūnijam un 31. augustam. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

Grafiks Nr.3 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. euro.”

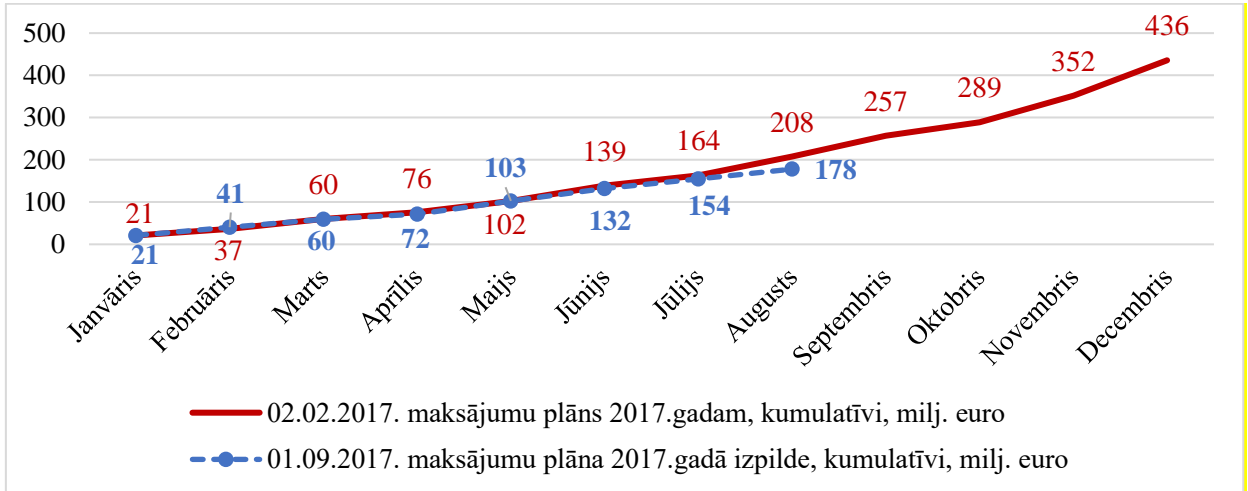


6. Atsevišķos pasākumos (piemēram, ceļu rekonstrukcijas, Rīgas revitalizācijas un profesionālo izglītības iestāžu modernizācijas projektos) ieviešana, t.sk. avansu izmaksas, notiek sekmīgāk un tas kompensē daļu no citu jomu vājākas naudas plūsmas. Negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē joprojām šādos specifiskos atbalsta mērķos: (1) 14,4 milj. euro investīcijās enerģētikas jomā, lielākoties daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumā; (2) 5,5 milj. euro investīcijās pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā; (3) sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā, t.i. ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos (daļēji skaidrojams ar samazinātu pieejamo finansējumu, pārdalot uz pasākumu subsidēto darba vietu izveidei nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem); (4) negatīva tendence sociālās uzņēmējdarbības un deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) pasākumos.

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - IPIA)⁴ projektu īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums

7. Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence saglabājas - plāns nav izpildīts 180 projektos par kopā 54,4 milj. euro, no kuriem 89 % (48,8 milj. euro) rada 48 projekti ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro. Vienlaikus pozitīvi, ka 89 projektos tika iesniegti maksājumu pieprasījumi vairāk nekā bija plānots. Tā rezultātā kopējā plāna līdz 2017. gada 1. septembrim neizpilde ir 18,0 milj. euro. Kopumā secināms, ka sākot ar 2017. gada maiju pieaug novirzes no plāna, taču augustā novirzes ir samazinājušās par 2,7 milj. euro. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā.

⁴ IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlasu projektos”: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

Grafiks Nr.4 "2014. - 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondu līdzfinansējums milj. euro."

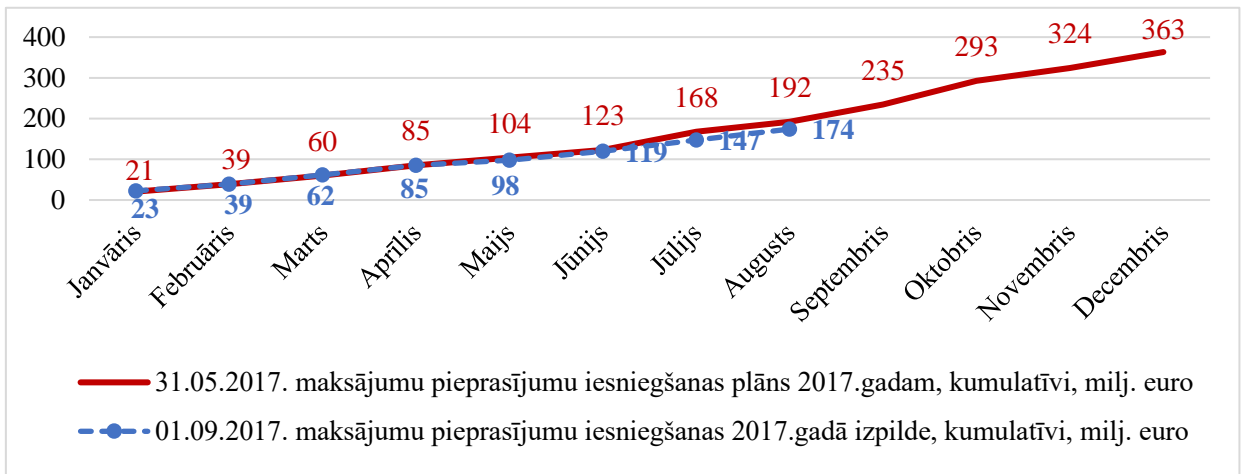

8. Kumulatīvi 2017. gadā vājāks sniegums pret sākotnējo plānu ir projektam "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem"⁵. EM sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un ALTUM izskata iespējas rast uzlabojumus ieviešanas mehānismā, lai sekmētu labāku rezultātu. Tāpat 2017. gada augustā lielākās neizpildes ir projektiem: "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā"⁶ 3,4 milj. euro un "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē"⁷ 3,2 milj. euro.

9. Līdz 2017. gada septembrim projektu īstenoņāji CFLA ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos, samazinot kopumā gada plānu par 31,8 milj. euro. Ziņojuma 3. pielikumā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi 2017. gadā un izmainītie plāni. FM uzskata, ka projektu iesniedzējiem atbildīgi jāņem vērā iepriekš sniegtās prognozes, nepieļaujot situāciju, ka, veicot izmaiņas maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā, mainās gada plāns samazinoties maksājumiem, pārceļot uz nākošiem gadiem. Šobrīd nav pārliecības, ka projektu īstenoņāji, kas maina plānus, spēs tos pildīt, jo kavētos maksājumus pārceļ uz vēlākiem termiņiem. Kā būtiskākie kavējumu faktori tiek minēti sarežģījumi iepirkumos, t.sk. to pārsūdzības, veikto darbu kavējumi, kā arī projektu vadības un galveno ekspertu kapacitāte atbilstoši nepieciešamai ieviešanas intensitātei. Tādēļ nepieciešami papildus finanšu disciplīnas pasākumi.

IPIA projektu iesniegumu plāna izpildes statuss 2017. gadā

10. Ziņojuma 4. pielikumā sniegta informācija par IPIA projektu iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju par statusu uz 2017. gada 22. septembri. Kopā atbilstoši projektu īstenoņāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 71


⁵ 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"

⁶ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas"

⁷ 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu"

projekti par 138,7 milj. euro ES fondu finansējuma. Visnozīmīgākā kavējumu ietekme ir plānotām investīcijām degradēto teritoriju revitalizācijas un vispārējās izglītības infrastruktūras jomās. Projektu īstenotāji, kas kopumā dažādos specifiskos atbalsta mērķos visvairāk finanšu izteiksmē kavē projektu iesniegšanu ir šādi: Daugavpils pilsētas dome, Liepājas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Balvu novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Grafiks Nr.5 "2014. - 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondu līdzfinansējums milj. euro (skaits)."

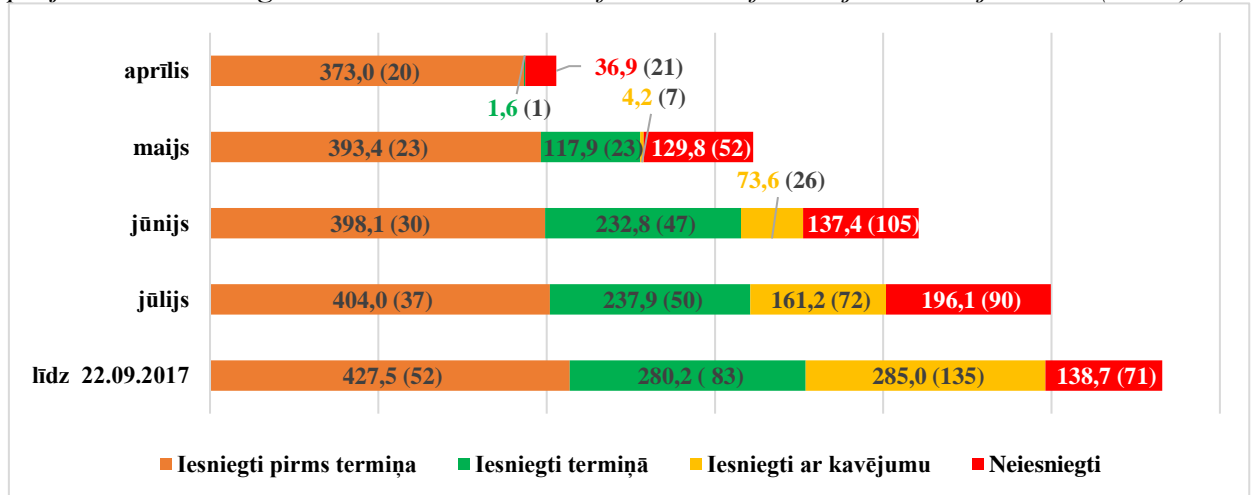

11. Kopumā konstatējams, ka projektu vadības kompetence un kapacitāte ir viena no problēmām, kas netiek nodrošināta pienācīgā kvalitātē, kad tiek gatavoti vai īstenoti vairāki projekti vienlaicīgi. FM aicina īstenotājus izmantot iespēju no projekta finansējuma attiecināt izmaksas, lai nodrošinātu nepieciešamo projekta vadības un atbalsta kvalitāti, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus ārpalpojumā.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – DP) prioritāro virzienu snieguma ietvara nosacījumu izpildes prognoze

12. FM sadarbībā ar CFLA un atbildīgajām iestādēm ir veikusi operatīvo snieguma ietvara nosacījumu izpildes novērtējumu (aktualizēts 2017. gada augustā – septembrī) katram DP prioritārajam virzienam, balstoties uz iespējami aktuāliem faktiem un risku novērtējumu. Prioritārie virzieni (turpmāk - PV), kur augsts – vidējs risks snieguma ietvara izpildē (nepieciešami stingrāki uzraudzības pasākumi vai papildus iniciatīvas izpildes uzlabojumiem) ir šādi: 8PV (izglītība ESF); 4PV (energoefektivitāte); 3PV (MVK konkurētspēja, ESF, TM); 5PV (vide); 9PV (veselība, sociālā iekļaušana). Saistībā ar ikmēneša ziņojumā⁸ sniegto informāciju par risku zaudēt izglītības jomas ESF snieguma ietvara rezervi 14,5 milj. euro apmērā, Finanšu ministre ir aicinājusi izglītības un zinātnes ministru veikt nepieciešamos pasākumus, lai paātrinātu īstenošanas tempus

⁸ Ziņojums, kas MK iesniegts 2017.gada 30.augustā, pieejams <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

atsevišķu IZM padotībā esošu iestāžu kā finansējuma saņēmēju pārziņā esošajos projektos⁹. Detalizēti aktuālā operatīvā informācija par prognozēm specifisko atbalsta mērķu un PV līmenī pieejama ES fondu tīmekļa vietnē¹⁰. Sekojot katra mēneša izpildes informācijai un konstatējot būtiskas atšķirības prognozēs, FM turpinās tās aktualizēt un vērst atbildīgo iestāžu uzmanību, vienlaikus informējot MK un sniedzot priekšlikumus rīcībai.

Citi aktuālie jautājumi

13. EM 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2. pasākums) pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. *euro*) un otrās kārtas (ERAF finansējums 27,6 milj. *euro*) ietvaros ir lūgusi projektu īstenotājus līdz 2017. gada 21. septembrim aktualizēt projektu iesniegšanas termiņus un naudas plūsmas plānus, ņemot vērā, ka projektu iesniedzēju norādītie termiņi projektu iesniegumu iesniegšanai CFLA būs stingri jāievēro – ja projektu iesniedzēji neiesniegs projektu noteiktajā termiņā, EM izvērtēs iespēju finansējumu pārdaļīt citu projektu vai pasākumu īstenošanai. EM ir informējusi, ka IZM aktualizēto informāciju plāno iesniegt līdz 2017. gada 2. oktobrim. EM līdz 2017. gada 9. oktobrim plāno iesniegt FM un CFLA apkopotu informāciju par 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu indikatīvām ikgadējām maksājumu plūsmām. Ja tiks konstatēti būtiski riski sasniegt 4.2.1.2. pasākuma plānotos sertificētos izdevumus uz 2018. gada 31. decembri, EM informēs MK par rīcības plānu plānotajām darbībām. Papildus šobrīd notiek 4.2.1.2. pasākuma papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodikas izstrāde. Metodika ir nosūtīta atkārtotai saskaņošanai FM un CFLA, un tā tiks izstrādāta līdz 2017. gada 2. oktobrim.

14. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” virzība¹¹ kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvdabas pārvaldes (turpmāk – RBP) rīcības plānam. Pozitīvi, ka 2017. gada 6. septembrī RBP,

⁹ Valsts izglītības attīstības aģentūras 8.3.5. SAM “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un 8.4.1. SAM “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektos; Valsts izglītības satura centra 8.3.1.1. SAMP “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”, 8.3.2.2. SAMP “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.5.2. SAM “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektos; Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 8.3.3. SAM “Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā; Izglītības kvalitātes valsts dienesta 8.3.4. SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā; Latvijas Darba devēju konfederācijas 8.5.1. SAM “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projektā.

¹⁰ Detalizētas operatīvās prognozes pieejamas prognožu apakšsadaļā un tiek regulāri aktualizētas: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

¹¹ Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros: <http://www.esfondi.lv/upload/mk-protokollemums.pdf>.

Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) un FM ekspertu tikšanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) (DG COMP) par 2017. gada 27. jūlijā iesniegto nepapīru (Non-paper) saistībā ar grozījumiem esošās Krievu salas nomas maksas metodoloģijā ietvaros DG COMP informēja, ka grozījumi spēkā esošajā valsts atbalsta lēmumā nebūs nepieciešami.

15. Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem (turpmāk - KDG) uzdevumu izpildes statuss¹²:

1) MK 2017. gada 16. augusta sēdē apstiprināti FM virzītie precizētie DP grozījumi Nr.2¹³, kas 2017. gada 29. augustā oficiāli iesniegti EK. Atbilstoši KDG lēmumam, nozaru ministrijas līdz 2017. gada 1. septembrim ir iesniegušas priekšlikumus DP grozījumiem Nr.3. Priekšlikumi ir apkopoti un tiks izskatīti KDG 2017. gada 5. oktobra sēdē.

2) Lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”¹⁴ projekta sakarā “Eurostat” līdz 2017. gada 1. septembrim nav sniedzis atzinumu par VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanu un tā iespējamo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu. SM kā atbildīgā iestāde ir lūgusi Centrālās Statistikas pārvaldi sazināties ar “Eurostat” par nepieciešamību paātrināt lēmuma pieņemšanu.¹⁵

3) Finanšu ministre 2017. gada 28. jūlijā atbildīgajām ministrijām nosūtītajās vēstulēs ir aicinājusi pārskatīt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumus, t.sk. esošās prasības attiecībā uz tehnisko projektu gatavības stadiju un kritērijiem ES fondu projektu iesniegšanai, un līdz 2017. gada 1. septembrim informēt par plānotajām darbībām un laika grafiku. Saņemti viedokļi no EM, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM), VM, Valsts kancelejas un Zemkopības ministrijas. Pārsvārā saņemta informācija, ka iestādes sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem regulāri pārskata atbalsta ieviešanas nosacījumus un nepieciešamības gadījumā veic atbilstošus grozījumus MK noteikumos, tādēļ šobrīd nav nepieciešamas izmaiņas esošajās prasībās. VARAM papildus ir informējusi, ka neatbalsta priekšlikumu mazināt nosacījumus projekta gatavības pakāpes mazināšanai, ievērojot jau esošo iespēju izmantot iespēju, kad projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir precizējami. No Valsts kancelejas saņemti priekšlikumi par vienkāršoto izmaksu plašāku piemērošanu, atbalstu iepirkumu

¹² Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā.

¹³ Rīkojuma projekts “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” paredz 8. un 9. prioritārā virziena snieguma ietvara grozījumus, Integrēto teritoriju investīciju kārtas izveidi 5.5.1. SAM un citus tehniskos grozījumus, precizējot ar MK 29.03.2017. Rīk. Nr.160 apstiprinātos grozījumus.

¹⁴ Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam

¹⁵ Ja tiks saņemts negatīvs “Eurostat” atzinums, Satiksmes ministrija atbilstoši 2017. gada 17. janvāra MK sēdes protokollēmuma Nr.3 39.§ 6.punktam gatavos informatīvo ziņojumu par alternatīvām pasākuma īstenošanas iespējām izskatīšanai MK un lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību.

procedūru organizēšanā, kā arī precizējumiem attiecināmo un neattiecināmo izmaksu vadlīniju saturā. Priekšlikumi tiek izvērtēti tālākai rīcībai. FM informēs iestādes un MK par plānotām darbībām turpmākos ikmēneša ziņojumos MK.

4) Citi aktuālie jautājumi iekļauti 2017. gada 5. oktobra KDG darba kārtībā, par ko materiālus gatavo un ziņos atbildīgās iestādes. Tāpat plānots izskatīt papildus priekšlikumus finanšu disciplīnas pasākumiem un snieguma rezerves izmantošanai. FM attiecīgi sniegs informāciju par lēmumiem turpmākos ikmēneša ziņojumos.

16. Kā iepriekš minēts, 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatīts regulārais pusgada ziņojums par ES fondu investīciju progresu, kam pievienots protokollēmums, kas paredz uzdevumus iestādēm. Atbilstoši iepriekšminētā protokola 9. punktam (FM iekļaut aktuālo informāciju par protokola 8. punkta izpildes statusu ikmēneša informatīvajā ziņojumā), sniedzam informāciju par atsevišķu uzdevumu izpildes statusu:

1) Attiecībā uz MK protokola 8.2. apakšpunktu – lai vienkāršotu un atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu sagatavošanu un īstenošanu, samazinot administratīvo slogu, VM 2017. gada 7. septembrī ir izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē MK noteikumu par 9.2.4. SAM¹⁶ īstenošanu¹⁷ grozījumu projektu, un līdz 2017. gada 22. septembrim VM ir iesniedzami iebildumi un priekšlikumi par MK noteikumu grozījumu projektu;

2) Attiecībā uz MK protokola 8.3. apakšpunktu – lai mazinātu administratīvo slogu, IZM ir iesniedzis saskaņošanai FM vienas vienības metodiku pedagogu un izglītības iestāžu atbalsta personāla atlīdzības izmaksu likmes noteikšanai 8.3.4. SAM¹⁸ un 8.3.2.2. pasākumam¹⁹, kā arī līdz 2017. gada 1. decembrim IZM ir jāizstrādā un jāiesniedz FM saskaņošanai vienreizējā maksājuma metodiku 8.3.4. SAM²⁰.

Turpmākā prioritārā rīcība:

Neatlaidīgs fokuss FM, CFLA, atbildīgajām iestādēm un projektu īstenošanai ir uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus. Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

¹⁶ Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

¹⁷ MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. SAM "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. SAMP "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. SAMP "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"

¹⁸ "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

¹⁹ "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

²⁰ "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

2017. gada 5. oktobrī plānota KDG sanāksme, kuras ietvaros tiks diskutēti vairāki ar ES fondu ieviešanu un konstatēto risku mazināšanas jautājumi. Par pieņemtajiem lēmumiem un uzdevumiem informācija tiks iekļauta nākamajos ziņojumos.

Ņemot vērā iepriekš minēto par projektu īstenotāju nespēju pildīt pašu paredzētos ieviešanas plānus, radot būtiskas negatīvas novirzes un ietekmi uz 2018. gada snieguma mērķi, ir nepieciešams ieviest stingrākus finanšu disciplīnas pasākumus. 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatīts ES fondu pusgada ziņojums par ES fondu ieviešanu²¹, kam pievienots protokollēmums, kas paredz dažādus uzdevumus iestādēm. Attiecīgi, izpildot protokola 8.9. apakšpunktu, šajā ziņojumā apkopota un iekļauta informācija par maksājumu plānu negatīvām novirzēm, t.sk. par katru plānoto vai īstenošanā esošu IPIA projektu, kur konstatētas ieviešanas finanšu plānu negatīvas novirzes vai projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā (šī ziņojuma pielikumi). Atbildīgajām iestādēm šī informācija ir jāņem par pamatu, lai izpildītu iepriekšminētā protokola 8.10. apakšpunktu - ES fondu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencē esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem sadarbībā ar CFLA nepieciešams izvērtēt situāciju par ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un līdz 2017. gada 1. novembrim iesniegt MK informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus darbības programmā noteikto mērķu izpildē.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Ziepniece 67095614
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv

²¹ Atbilstoši 2017. gada 12. septembra MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p. (pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2017-09-14>)
